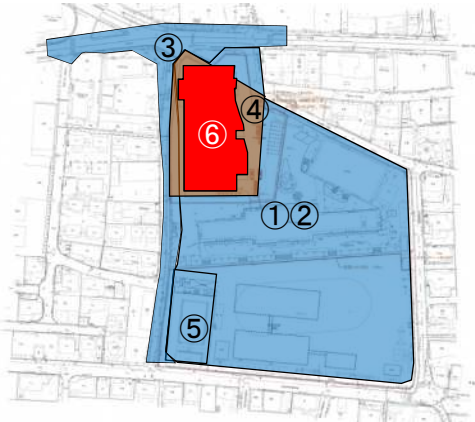
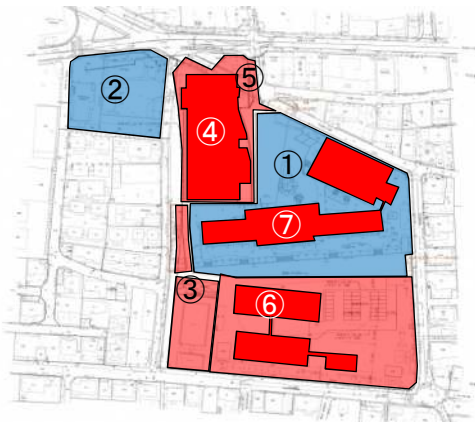
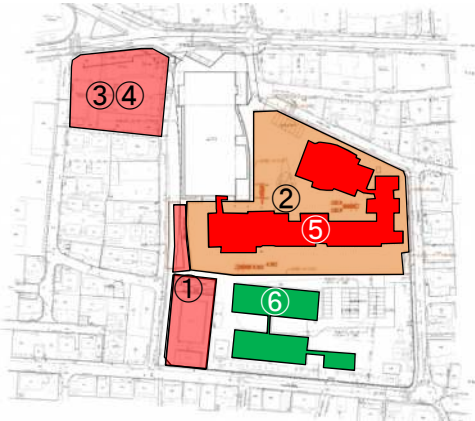
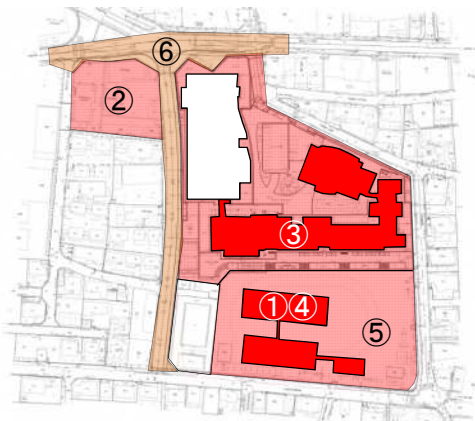


伊達小学校改築事業の進捗イメージ

令和5年2月22日現在

令和2年度	令和3年度	令和3年度
	①伊達小学校・児童クラブ館 改築実施設計 ②敷地造成設計 ③周辺道路設計 ④幼稚園跡地 発掘調査 ⑤プール付属屋 移設設計 ⑥アリーナ棟 改築工事着工	 ①校舎・体育館解体設計 ②児童館等解体設計 ③プール附属棟 移設工事着工 (2工区屋外整備工事) ④アリーナ棟 改築工事竣工 ～引越し ⑤1工区屋外整備工事 ⑥仮設校舎 建設工事～引越し ⑦校舎・体育館 解体工事着工
令和4年度	令和5年度～令和6年度	令和5年度～令和6年度
	①プール附属棟 移設工事竣工 (2工区屋外整備工事) ②校舎・体育館 解体工事竣工 埋蔵文化財発掘調査 (長倉館跡) ③児童クラブ館 解体工事竣工 ④駐車場整備工事設計 ⑤校舎・講堂 改築・建設工事着工 (3工区屋外整備工事) ⑥仮設校舎リース	 ①仮設校舎リース ②駐車場整備工事 ③校舎・講堂 改築・建設工事竣工 ～引越し ④仮設校舎 解体工事 ⑤4・5工区屋外整備工事 着工 ⑥周辺道路改良工事 着工 令和6年度 ■周辺道路改良工事 竣工 ■4・5工区屋外整備工事 竣工
